PT BUANA MENARA INDONESIA

FTTH PROJECT MANAGEMENT · KALIMANTAN SELATAN

Panduan Penggunaan FTTH Project Control Portal

Portal FTTH, Portal Waspang dan spreadsheet,
langkah demi langkah dengan gambar

Masuk sekali | Portal FTTH | Portal Waspang | Spreadsheet | Bantuan & Masukan

Diperbarui 13 Oktober 2026

Alamat portal: **buanamenara.github.io/portal-ftth**

Menu Regional Project Manager (RPM) di Portal FTTH tidak dibahas di panduan ini

Daftar Isi

Bagian A — Masuk dan Berpindah Portal

A1. Membuka FTTH Project Control Portal dan masuk
A2. Menu portal sesuai peran akun
A3. Berpindah antara Portal FTTH dan Portal Waspang
A4. Bantuan & Masukan

Bagian B — Portal FTTH

B1. Halaman Beranda (Dashboard Portal)
B2. Submit BOQ (file Excel)
B3. Submit BOQ dari PDF Opname
B4. Warehouse – BA Transaksi (dibuat otomatis)
B5. Warehouse – Submit BA Transaksi (unggah berkas bertanda tangan)
B6. Tampilan di ponsel

Bagian C — Portal Waspang

C1. Tampilan dan menu Portal Waspang
C2. Laporan Harian – mengisi data laporan
C3. Laporan Harian – volume harian (Today / Total / BOQ Plan)
C4. Laporan Harian – memeriksa dan mengirim (Telegram + WhatsApp)
C5. BOQ Plan
C6. Dokumentasi Lapangan – memilih site dan kategori
C7. Dokumentasi Lapangan – mengirim foto dan PDF
C8. Tabel Master SOW dan tanda "Sedang Aktif"

Bagian D — Spreadsheet

D1. Sheet DASHBOARD
D2. Kurva S: Baseline, Forecast, Actual
D3. Sheet DATA BASE
D4. Sheet DRAWING, WAREHOUSE, OPNAME
D5. Sheet BA TRANSAKSI dan REKAP BA
D6. Sheet REKON dan CLOSING OPNAME
D7. Alur kerja BA Material (flowchart)
D8. Spreadsheet Portal Waspang

Bagian E — Bila Ada Masalah

E1. Masuk, akun dan tampilan
E2. Portal FTTH
E3. Portal Waspang

BAGIAN A · MASUK · A1 · BARU

Membuka FTTH Project Control Portal dan masuk


Semua portal dibuka dari satu alamat: **buanamenara.github.io/portal-ftth**. Halaman pertama yang muncul adalah **FTTH Project Control Portal**, tempat masuk satu kali untuk Portal FTTH dan Portal Waspang. Tidak perlu akun Google.

1. Buka alamat di atas di Chrome (HP atau komputer).
2. Isi **Username** dan **Password** akun Anda, lalu ketuk **Masuk**.
3. Pilih portal yang ingin dibuka (lihat A2).


> **Akun dan password** dibuat oleh RPM. Satu akun berlaku untuk semua portal. Bila akun dinonaktifkan, Anda tidak bisa masuk sampai RPM mengaktifkannya lagi. Password akun sendiri bisa diganti di Portal FTTH, menu **Administration**.

> **Pasang sebagai aplikasi di HP.** Di Chrome, buka menu titik tiga lalu pilih **Tambahkan ke layar utama** atau **Instal aplikasi**. Ikon **Portal FTTH** akan muncul di layar HP dan langsung membuka halaman masuk ini.

Setelah masuk, sesi tersimpan di perangkat selama 6 jam, jadi tidak perlu mengetik password setiap kali berpindah portal.



HP

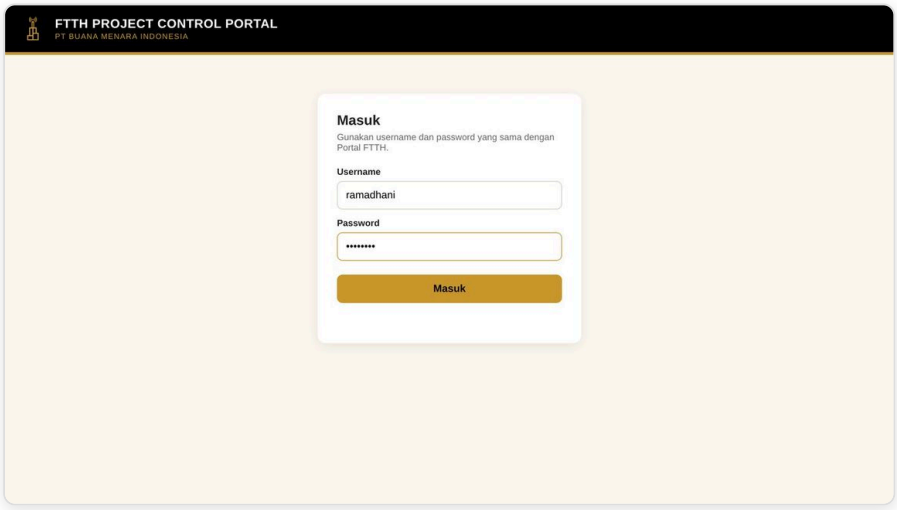

Komputer

Halaman masuk FTTH Project Control Portal: cukup username dan password.


BAGIAN A · MASUK · A2 · BARU

Menu portal sesuai peran akun


Setelah masuk, muncul sapaan **Halo, [nama]** dan kartu portal yang boleh dibuka akun Anda. Ketuk **Buka →** pada kartu untuk masuk ke portal itu; Anda langsung masuk tanpa diminta password lagi.

Peran akun	Portal yang muncul	Keterangan
RPM	Portal FTTH, Portal Waspang	Semua menu, termasuk menu khusus RPM dan mengubah Total di Portal Waspang.
Admin	Portal FTTH	Submit BOQ dan Warehouse.
Waspang	Portal Waspang, Portal FTTH	Laporan Harian (Daily Report EMR), BOQ Plan dan dokumentasi lapangan.

Nama dan peran akun tampil di kanan atas. Tombol **Keluar** di sebelahnya mengakhiri sesi di perangkat itu; pakai tombol ini bila HP atau komputer dipakai bergantian.



HP

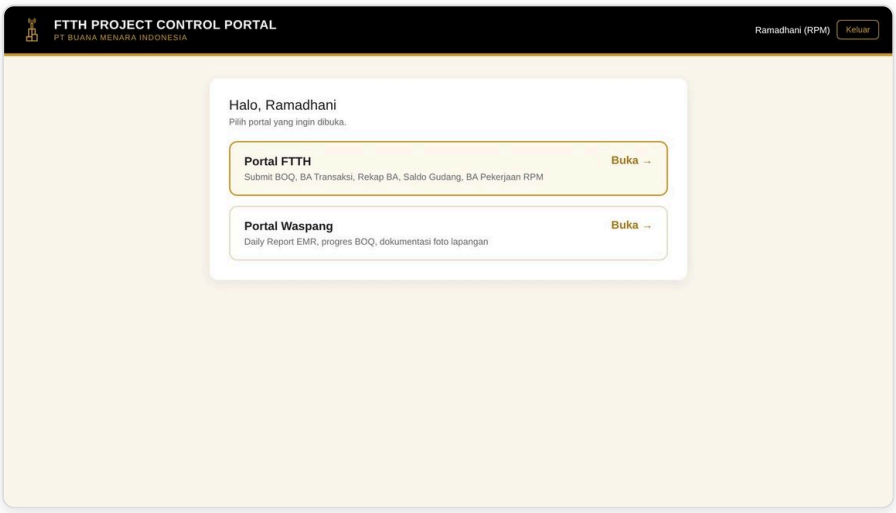

Komputer


Menu portal untuk akun RPM: Portal FTTH dan Portal Waspang.

BAGIAN A · MASUK · A3 · BARU


Berpindah antara Portal FTTH dan Portal Waspang

Tidak perlu kembali ke halaman masuk untuk berpindah portal:

- **Dari Portal FTTH ke Portal Waspang:** ketuk nama Anda di kanan atas, lalu pilih **Portal Waspang**. Pilihan ini hanya muncul untuk akun RPM dan Waspang.
- **Dari Portal Waspang ke Portal FTTH:** ketuk tombol 🏠 **Portal FTTH** di kanan atas.
- **Keluar:** di Portal FTTH ada pilihan **Keluar** di menu nama; di Portal Waspang ada tombol 🚪 **Keluar**. Keduanya kembali ke halaman masuk dan mengakhiri sesi di perangkat itu.



Portal FTTH: menu nama di kanan atas berisi Portal Waspang dan Keluar.



Portal Waspang: tombol 🏠 Portal FTTH dan 🚪 Keluar di kanan atas.


BAGIAN A · BANTUAN · A4 · BARU

Bantuan & Masukan


Portal FTTH dan Portal Waspang sama-sama punya tombol bulat **?** di kanan bawah layar (di HP, tepat di atas menu bawah). Ketuk tombol itu untuk membuka jendela **Bantuan & Masukan** dengan dua tab:

- **Panduan:** tombol **Unduh PDF Panduan** membuka dokumen ini. Bila PDF terbuka sebagai pratinjau, ketuk lama lalu pilih **Simpan ke File** atau gunakan tombol unduh di peramban.
- **Kritik & Saran:** tulis masukan untuk portal, lalu ketuk **Kirim Masukan**. Nama boleh dikosongkan; di Portal Waspang nama terisi otomatis dari akun dan boleh diubah.


> **Ke mana masukan dikirim?** Semua masukan dari kedua portal masuk ke tab **KRITIK DAN SARAN** di spreadsheet RPM, lengkap dengan tanggal, jam, peran dan portal asalnya. Hanya RPM/pemilik yang membacanya. Kolom **Status** (Baru / Dibaca / Selesai) bisa diubah RPM untuk menandai tindak lanjut.



Portal FTTH – Panduan



Portal Waspang – Panduan



Portal Waspang – Kritik & Saran

Jendela Bantuan & Masukan di kedua portal.


BAGIAN B · PORTAL FTTH · B1

Halaman Beranda (Dashboard Portal)


Setelah Portal FTTH dibuka, halaman Beranda menampilkan ringkasan progres proyek: total site, persentase Permit/Instalasi/BA Closing, grafik progres per area, daftar site terbaru, peta sebaran area, dan daftar area yang perlu perhatian (permit belum approved, site masih proses instalasi).

Menu navigasi ada di sisi kiri: **Dashboard**, **Submit BOQ**, **Warehouse**, **Project Dashboard**, **Regional Project Manager** (khusus RPM), **Administration**, dan **Log History** (khusus RPM).

- Header (logo dan judul) serta menu kiri tetap menempel di layar saat konten di-scroll, jadi berpindah menu tidak perlu scroll kembali ke atas.
- Menu yang sedang dibuka disorot warna gold, termasuk Warehouse saat berpindah antara kartu BA Transaksi dan Submit BA Transaksi.
- Portal langsung terbuka begitu dipilih dari FTTH Project Control Portal; bila sesi sudah habis, portal mengarahkan kembali ke halaman masuk.

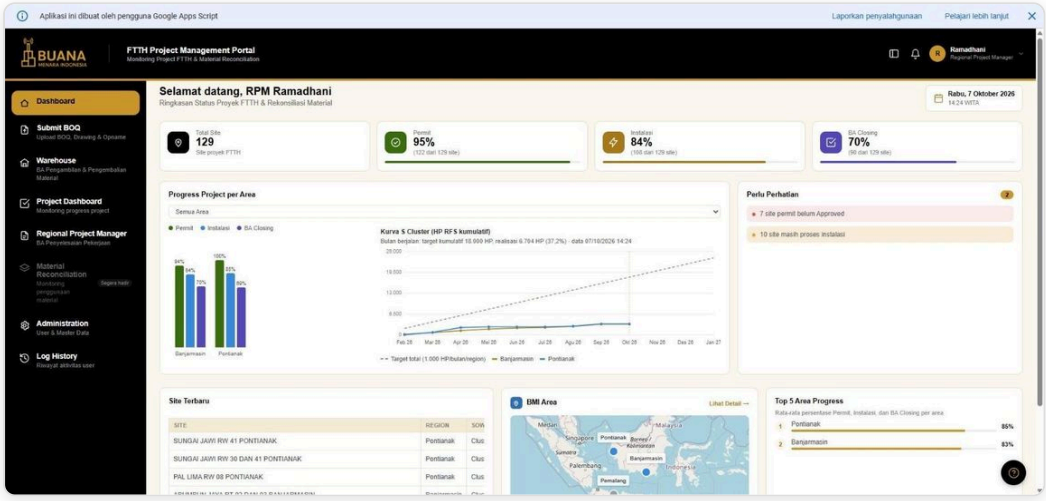

Dashboard portal: kartu KPI, grafik progres, dan ringkasan area.

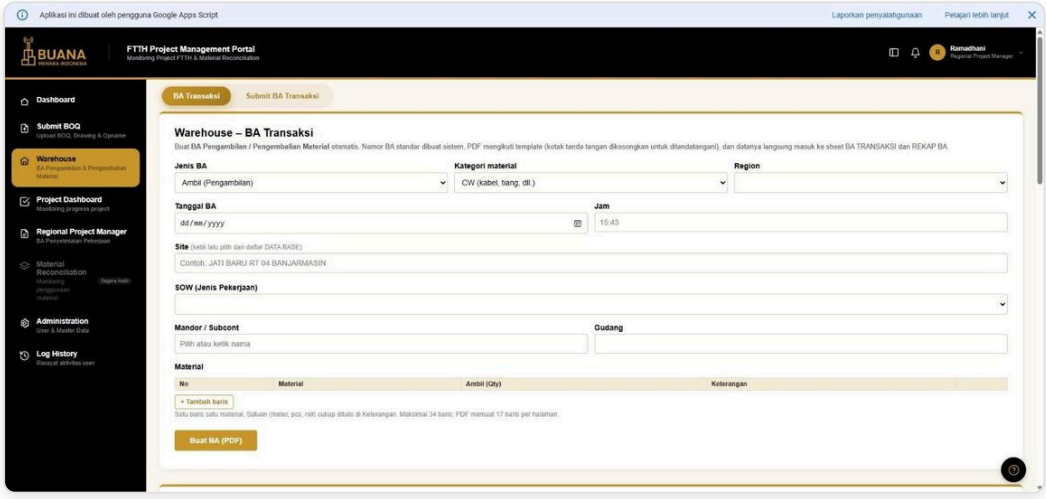


Menu "Warehouse" tersorot gold selama halamannya aktif.

BAGIAN B · PORTAL FTTH · B2

Submit BOQ (file Excel)

Menu untuk mengunggah file BOQ (.xlsx) dan otomatis mengisi sheet **DRAWING**, **WAREHOUSE**, atau **OPNAME** sesuai jenis BOQ-nya. Langkahnya: pilih file → portal membaca dan menampilkan pratinjau isi → periksa → kirim. Untuk sheet OPNAME, file PDF Opname hasil scan juga bisa dipakai (lihat B3).

- Item BOQ yang punya dua kolom pasangan di sheet tujuan (mis. Suspension 48/144, Dead End/Dead End 144) harus dipilih salah satu kolomnya.
- "Plate belt 20mm" otomatis dipecah: Plat Belt = 50% dari volume BOQ (dibulatkan ke atas), Stopping = 100%.
- Baris yang sudah ada di sheet akan diperbarui; site baru ditambahkan sebagai baris baru.
- Nama Site dipilih dari daftar DATA BASE yang muncul saat mengetik, jangan diketik bebas.

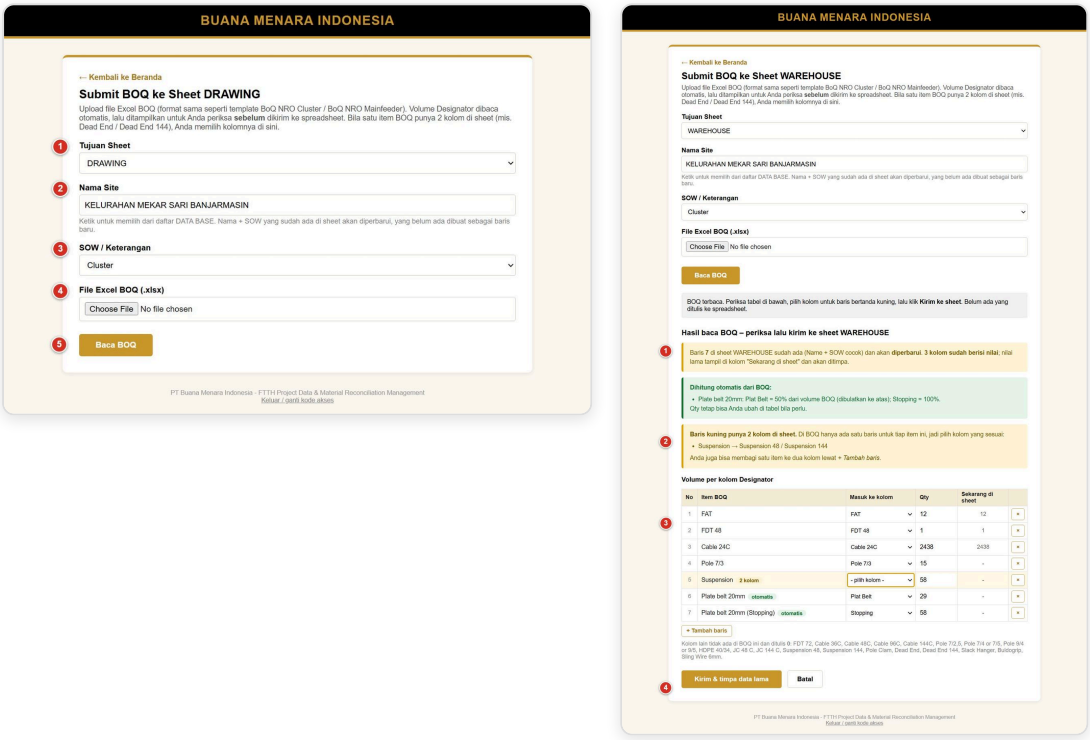

Kiri: form unggah BOQ. Kanan: pratinjau isi sebelum dikirim.

BAGIAN B · PORTAL FTTH · B3 · BARU

Submit BOQ dari PDF Opname

Form **MyRepublic Project Opname Submission Form** yang sudah diisi tulisan tangan dan di-scan (PDF) bisa langsung dibaca portal untuk mengisi sheet **OPNAME**, tanpa mengetik ulang.


1. Di menu **Submit BOQ**, pilih **Tujuan Sheet** = **OPNAME** (PDF hanya bisa dipakai untuk OPNAME).
2. Pilih SOW, PIC bila perlu, lalu pilih file PDF Opname dan klik **Baca BOQ**. Pembacaan butuh sekitar 10–30 detik; halaman 1–3 PDF yang dibaca.
3. **Nama Site** terisi otomatis dari nama cluster di PDF, dicocokkan dengan nama yang paling mirip di DATA BASE. Periksa lagi bila perlu.
4. Periksa pratinjau (gambar di halaman berikut), betulkan angka atau kolom bila perlu, lalu klik **Kirim ke sheet**.

Yang tampil di pratinjau	Artinya
Info dari PDF Opname (kotak hijau)	Area, HP RFS, PR Number, PO Number, DRM Date dan RFS Declare Date yang terbaca dari bagian atas form. Field yang kosong di PDF tidak ditampilkan.
Cek silang (kotak kuning)	Portal mencocokkan: jumlah semua tiang = Label Pole = Bahan Pondasi tiang, jumlah FAT = Label FAT = Testcomm OTDR, FDT = Label FDT. Bila tidak sama, baris-baris yang disebut perlu dicocokkan dengan PDF asli.
Baris merah **Cek Qty**	Angka tulisan tangan yang belum pasti. Di bawah nama item tertulis alasannya, mis. "OCR Google membaca 13, OCR.space membaca 73". Cocokkan dengan PDF, ubah kotak Qty bila salah.
Keterangan abu-abu di bawah item	Asal angka yang sudah pasti, mis. "cocok dengan cek silang", atau "Baris dari Note di bawah tabel PDF" untuk tiang tambahan yang ditulis di Note.
Baris jasa / label	Splicing, Testcomm, Label dan Bahan Pondasi tidak punya kolom di sheet OPNAME, jadi hanya dicantumkan sebagai daftar.
Teks hasil OCR PDF Opname	Teks mentah yang dibaca mesin. Bila ada yang salah baca, salin isinya dan kirim ke RPM atau admin.

Dua mesin baca: angka tulisan tangan dibaca oleh OCR.space (tahu posisi baris) dan OCR Google (lebih teliti membaca angka). Hasil keduanya dicocokkan baris per baris; bila berbeda, cek silang yang menentukan. Bila PDF sama sekali tidak terbaca, tombol kirim dinonaktifkan supaya data lama di sheet tidak tertimpa jadi 0.

BAGIAN B · PORTAL FTTH · B3 · BARU

Submit BOQ dari PDF Opname – contoh pratinjau

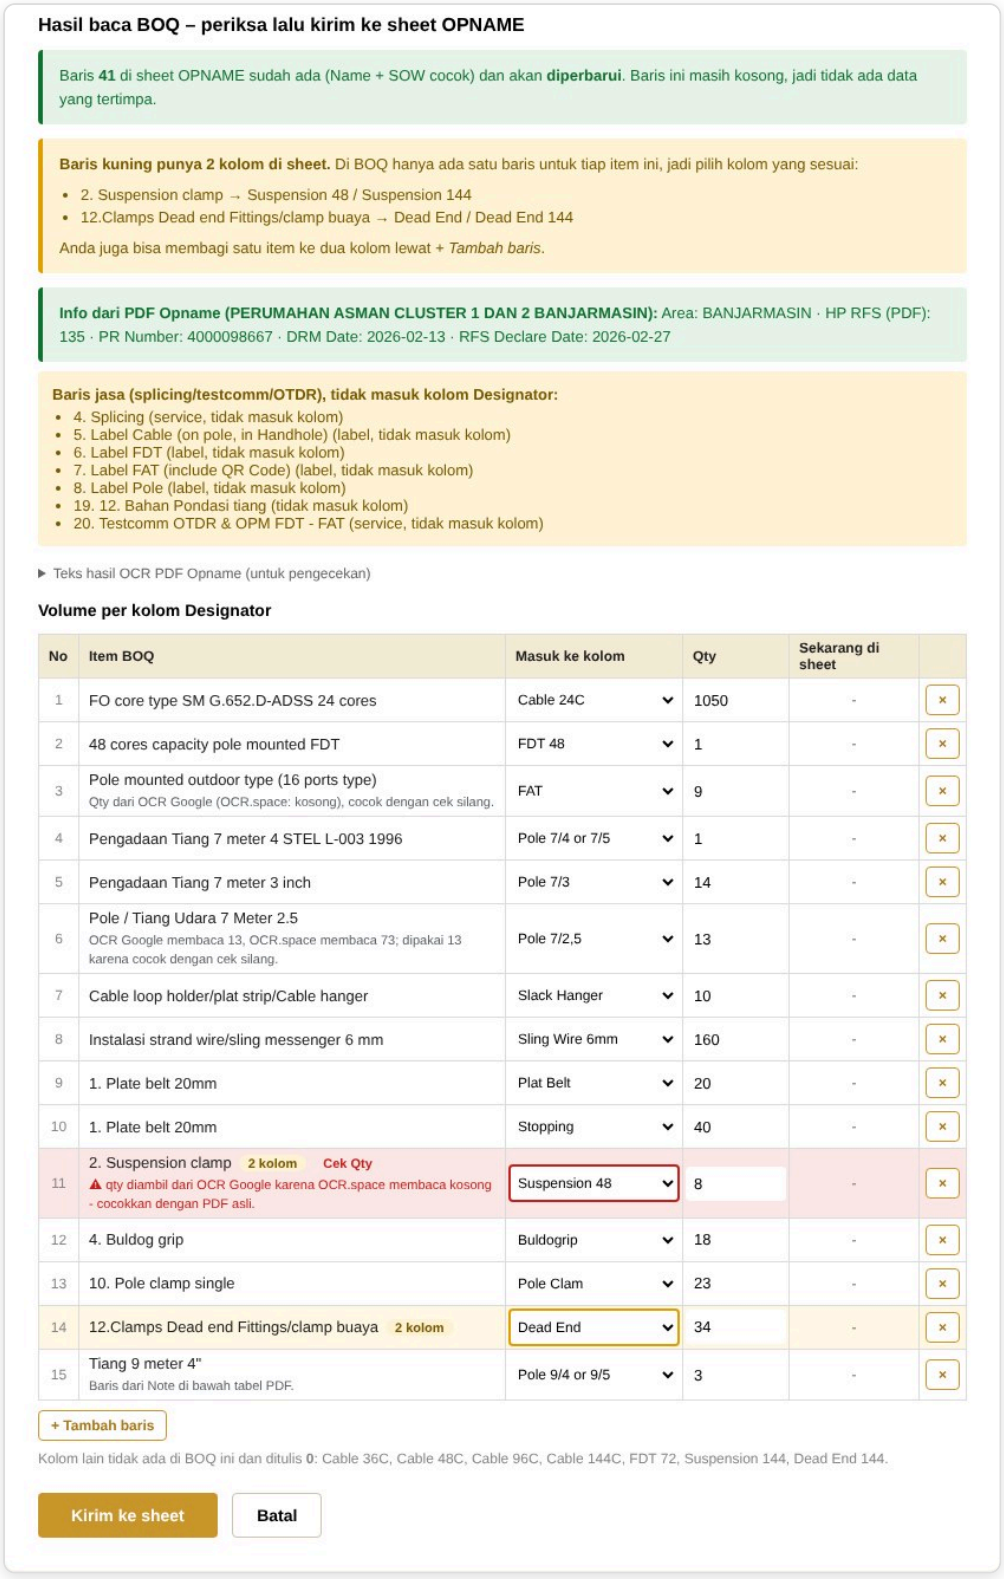

Hasil baca BOQ – periksa lalu kirim ke sheet OPNAME

Baris **41** di sheet OPNAME sudah ada (Name + SOW cocok) dan akan **diperbarui**. Baris ini masih kosong, jadi tidak ada data yang tertimpa.

Baris kuning punya 2 kolom di sheet. Di BOQ hanya ada satu baris untuk tiap item ini, jadi pilih kolom yang sesuai:

- 2. Suspension clamp → Suspension 48 / Suspension 144
- 12.Clamps Dead end Fittings/clamp buaya → Dead End / Dead End 144

Anda juga bisa membagi satu item ke dua kolom lewat + *Tambah baris*.

Info dari PDF Opname (PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN): Area: BANJARMASIN · HP RFS (PDF): 135 · PR Number: 4000098667 · DRM Date: 2026-02-13 · RFS Declare Date: 2026-02-27

Baris jasa (splicing/testcomm/OTDR), tidak masuk kolom Designator:

- 4. Splicing (service, tidak masuk kolom)
- 5. Label Cable (on pole, in Handhole) (label, tidak masuk kolom)
- 6. Label FDT (label, tidak masuk kolom)
- 7. Label FAT (include QR Code) (label, tidak masuk kolom)
- 8. Label Pole (label, tidak masuk kolom)
- 19. 12. Bahan Pondasi tiang (tidak masuk kolom)
- 20. Testcomm OTDR & OPM FDT - FAT (service, tidak masuk kolom)

▶ Teks hasil OCR PDF Opname (untuk pengecekan)

Volume per kolom Designator

No	Item BOQ	Masuk ke kolom	Qty	Sekarang di sheet	
1	FO core type SM G.652.D-ADSS 24 cores	Cable 24C	1050	-	×
2	48 cores capacity pole mounted FDT	FDT 48	1	-	×
3	Pole mounted outdoor type (16 ports type) Qty dari OCR Google (OCR.space: kosong), cocok dengan cek silang.	FAT	9	-	×
4	Pengadaan Tiang 7 meter 4 STEL L-003 1996	Pole 7/4 or 7/5	1	-	×
5	Pengadaan Tiang 7 meter 3 inch	Pole 7/3	14	-	×
6	Pole / Tiang Udara 7 Meter 2.5 OCR Google membaca 13, OCR.space membaca 73; dipakai 13 karena cocok dengan cek silang.	Pole 7/2,5	13	-	×
7	Cable loop holder/plat strip/Cable hanger	Slack Hanger	10	-	×
8	Instalasi strand wire/sling messenger 6 mm	Sling Wire 6mm	160	-	×
9	1. Plate belt 20mm	Plat Belt	20	-	×
10	1. Plate belt 20mm	Stopping	40	-	×
11	2. Suspension clamp 2 kolom Cek Qty ⚠ qty diambil dari OCR Google karena OCR.space membaca kosong - cocokkan dengan PDF asli.	Suspension 48	8	-	×
12	4. Buldog grip	Buldogrip	18	-	×
13	10. Pole clamp single	Pole Clam	23	-	×
14	12.Clamps Dead end Fittings/clamp buaya 2 kolom	Dead End	34	-	×
15	Tiang 9 meter 4" Baris dari Note di bawah tabel PDF.	Pole 9/4 or 9/5	3	-	×

+ Tambah baris

Kolom lain tidak ada di BOQ ini dan ditulis **0**: Cable 36C, Cable 48C, Cable 96C, Cable 144C, FDT 72, Suspension 144, Dead End 144.

Kirim ke sheet | Batal


Contoh PDF Opname Perumahan Asman Cluster 1 dan 2: FAT dan Pole 7/2,5 dipastikan oleh cek silang, Suspension ditandai Cek Qty, dan Tiang 9 meter dari Note ikut terbaca.

BAGIAN B · PORTAL FTTH · B4

Warehouse – BA Transaksi (dibuat otomatis)

Kartu **BA Transaksi** di menu Warehouse membuat Berita Acara Pengambilan/Pengembalian Material secara otomatis, tanpa perlu diketik atau diunggah manual. Isian: jenis BA (Ambil/Pengembalian), kategori material (Electric atau CW untuk Ambil; satu template untuk Pengembalian), region, tanggal, jam, site (dari DATA BASE), SOW, mandor, gudang, dan baris material + jumlah (maksimal 34 baris).

> **Hasilnya:** PDF mengikuti template resmi perusahaan (kop surat, tabel material, kotak tanda tangan dikosongkan untuk ditandatangani). PDF tersimpan otomatis di Drive dan langsung tercatat di sheet BA TRANSAKSI, dan REKAP BA ikut terhitung tanpa langkah tambahan. Nomor BA dibuat otomatis dengan format `BA/{jenis}/{kode region}/{tahun-bulan}/{urut}`, mis. `BA/OUT-CW/BJM/2609/001`.

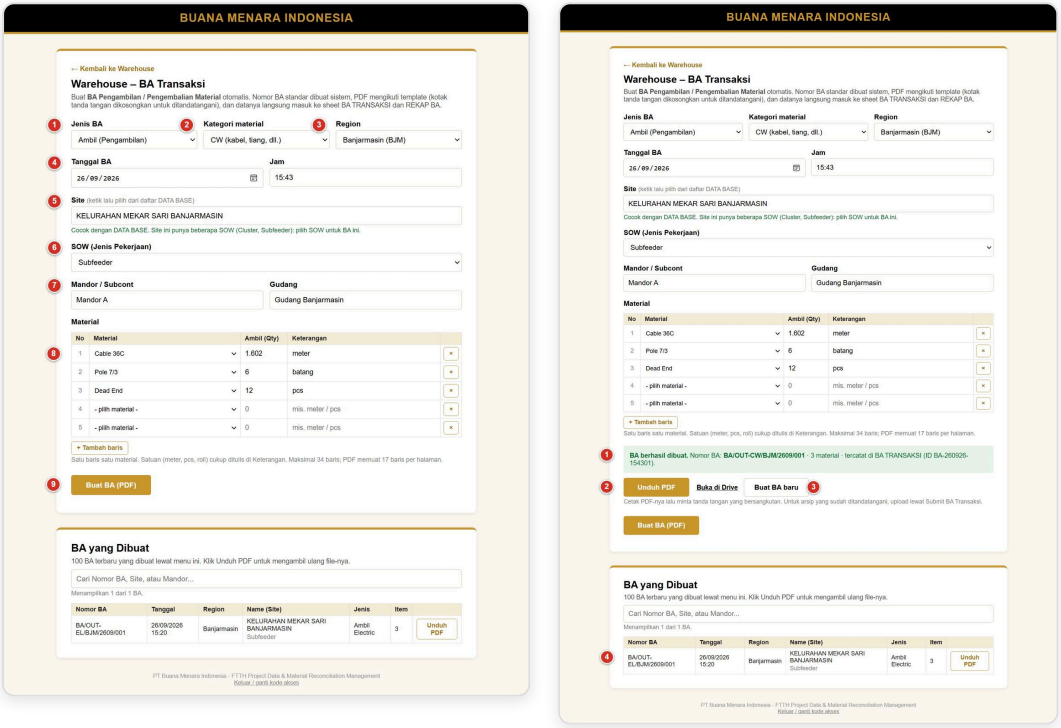


Kiri: isi form BA Transaksi. Kanan: BA yang diterbitkan, siap diunduh dan ditandatangani.

BAGIAN B · PORTAL FTTH · B5

Warehouse – Submit BA Transaksi (unggah berkas bertanda tangan)

Kartu **Submit BA Transaksi** dipakai untuk mengunggah arsip BA yang sudah ditandatangani fisik (hasil scan atau foto). Portal membaca isinya lewat OCR, lalu menampilkan hasil bacaan untuk diperiksa satu per satu sebelum disimpan.


- Bisa unggah 1 atau banyak PDF/foto sekaligus (maksimal 15) untuk site yang sama.
- SOW (jenis pekerjaan) wajib dipilih saat meninjau hasil baca.
- Foto dari kamera ponsel otomatis dikonversi jadi PDF satu halaman sebelum dibaca; satu foto dianggap satu BA.
- Berkas asli (PDF/foto) ikut tersimpan di Drive sebagai arsip.
- Bila ada isian yang salah terbaca, buka bagian "Teks hasil OCR" di pratinjau lalu benarkan manual.

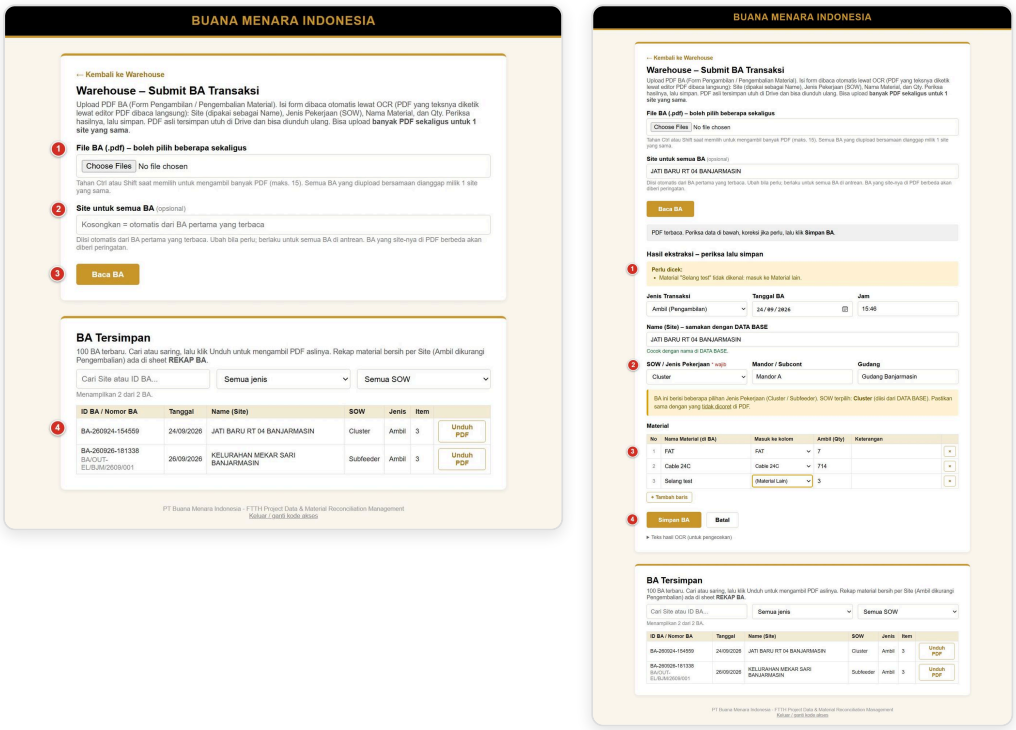

Kiri: unggah berkas. Kanan: pratinjau hasil baca OCR, siap diperiksa dan disimpan.

Tampilan di ponsel

Portal FTTH otomatis menyesuaikan tampilan di layar ponsel: tata letak satu kolom, tombol dan isian diperbesar agar mudah disentuh, menu pindah ke bar bawah layar, dan tabel riwayat berubah jadi kartu per baris (bukan tabel lebar yang perlu digeser). Tidak perlu pengaturan tambahan.

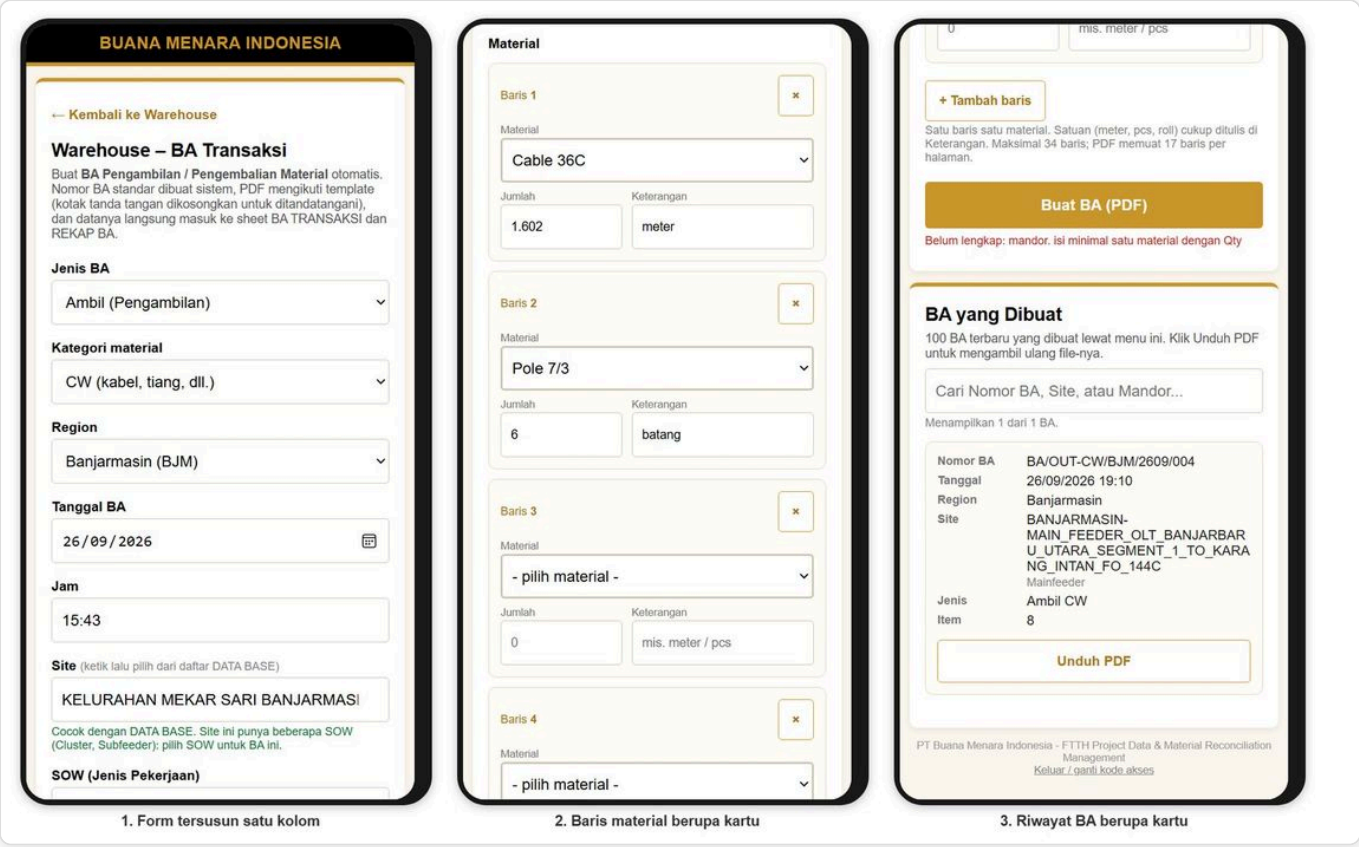

Tampilan Portal FTTH yang menyesuaikan otomatis di layar ponsel.


BAGIAN C · PORTAL WASPANG · C1 · BARU

Tampilan dan menu Portal Waspang

Portal Waspang dipakai waspang di lapangan untuk tiga pekerjaan, masing-masing satu menu di bar bawah layar HP (di komputer, menunya ada di atas):

Menu	Untuk apa	Hasilnya masuk ke
📝 **Laporan Harian**	Laporan harian EMR: data pekerjaan dan volume hari ini.	Grup Telegram **@ReportBMI**, grup WhatsApp pilihan Anda, dan tab **DAILY REPORT EMR**.
📊 **BOQ Plan**	Target volume (BOQ Plan) per site dan SOW.	Tab **MASTER BOQ CLUSTER**.
📸 **Dokumentasi Lapangan**	Foto dan PDF dokumentasi lapangan.	Folder Drive **DOKUMENTASI FTTH**, grup Telegram, grup WhatsApp dan tab **LOG FOTO WASPANG**.

- **Daftar site** di ketiga menu diambil dari sheet **DATA BASE** Portal FTTH (Name + SOW). Site baru yang ditambahkan di DATA BASE ikut muncul di Portal Waspang paling lambat sekitar 10 menit kemudian.
- Site dan SOW yang dipilih di satu menu ikut terpilih di menu lain, jadi cukup dipilih sekali. Di atas setiap daftar cluster ada kotak 🔍: ketik nama atau nomor untuk mencari cluster.
- Data BOQ Plan dan Total dibaca dari spreadsheet, sehingga semua HP melihat angka yang sama.
- Tombol **?** di kanan bawah membuka Bantuan & Masukan (lihat A4).

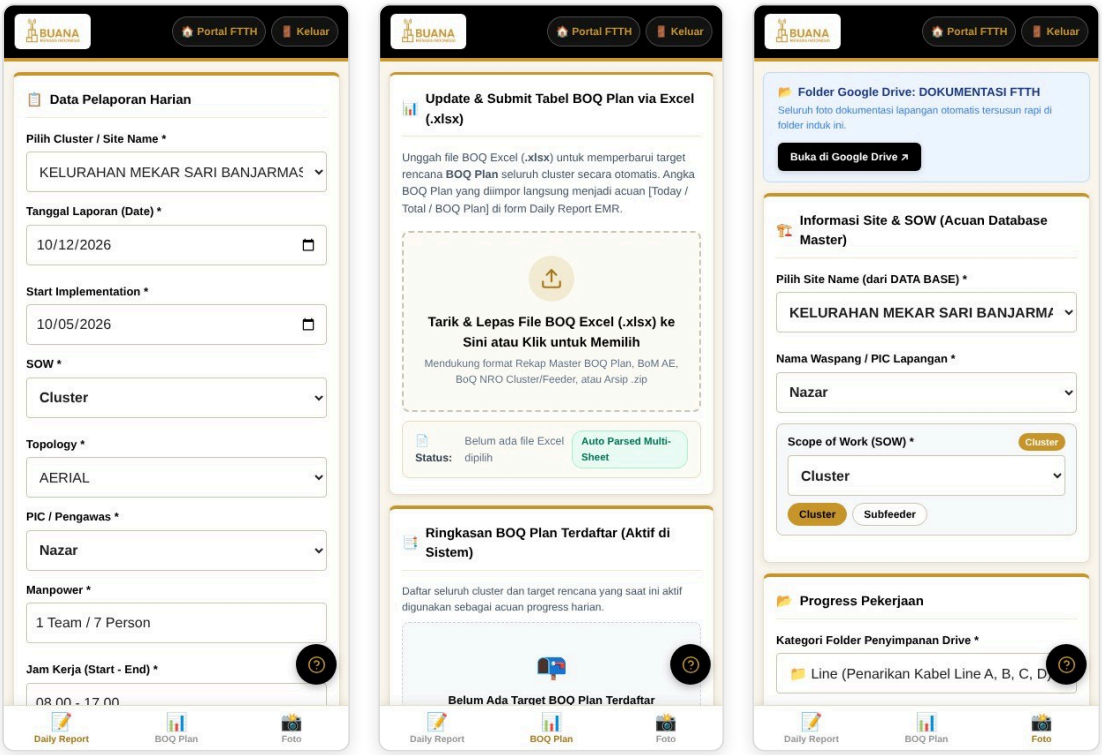

📝 Laporan Harian 📊 BOQ Plan 📸 Dokumentasi

Portal Waspang di HP: tombol Portal FTTH dan Keluar di atas, menu Laporan Harian, BOQ Plan dan Dokumentasi di bawah.


BAGIAN C · PORTAL WASPANG · C2 · BARU

Laporan Harian – mengisi data laporan

Buka menu 📝 **Laporan Harian**, lalu isi kartu **Data Pelaporan Harian**:

Isian	Keterangan
Pilih Cluster / Site Name	Pilih dari daftar DATA BASE.
Tanggal Laporan	Tanggal pekerjaan yang dilaporkan.
Start Implementation	Tanggal mulai pekerjaan di site ini.
SOW	Jenis pekerjaan (Cluster, Subfeeder, Mainfeeder, Hubfeeder, Uplink atau FWA) sesuai DATA BASE. Bila site hanya punya satu SOW, terpilih otomatis.
Topology	Mis. AERIAL.
PIC / Pengawas	Nama waspang yang melapor.
Manpower	Jumlah tim dan orang, mis. 1 Team / 7 Person.
Jam Kerja	Jam mulai dan selesai, mis. 08.00 - 17.00.

Di bagian bawah halaman ada kotak **Aktivitas Hari Ini**: tulis poin pekerjaan hari itu, satu poin per baris (mis. "- Tanam tiang Line A").

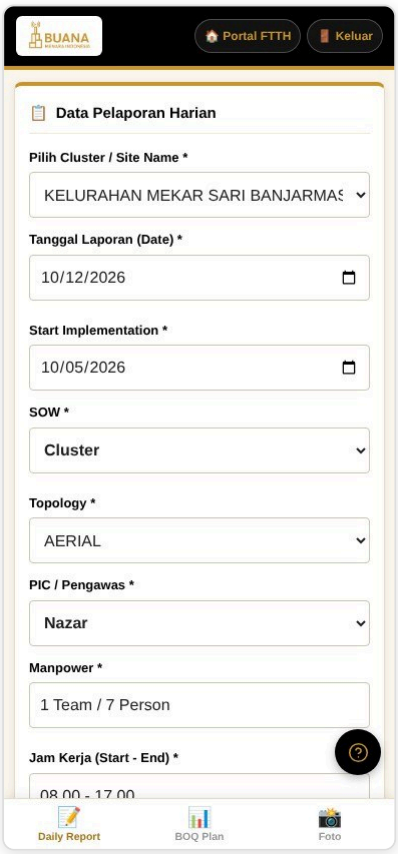

Kartu Data Pelaporan Harian.

BAGIAN C · PORTAL WASPANG · C3 · BARU


Laporan Harian – volume harian (Today / Total / BOQ Plan)

Kartu **Input Volume Harian** menampilkan material site itu per kategori (Pekerjaan Sipil, Install Pole, Pulling cable, Install Aksesories, Electrical). Setiap item punya empat kotak:

- **Satuan** – Btg, meter, pcs, Unit, dsb.
- **Today** – isi volume yang dikerjakan **hari ini saja**.
- **Total** – jumlah semua laporan sebelumnya ditambah Today; terhitung otomatis dan sama di semua HP.
- **BOQ Plan** – target dari menu BOQ Plan.

Tanda di bawah setiap item: ❌ belum ada progres, 🔄 **Progress** sudah dikerjakan tapi belum mencapai Plan, ✅ **Selesai** sudah mencapai Plan. Tombol ✔️ **Selesai** menandai item selesai walaupun angkanya belum sama dengan Plan.

> **Hanya item aktif.** Secara bawaan hanya item yang punya BOQ Plan yang ditampilkan. Ketuk **Lihat Semua Item** untuk menampilkan semua material. Total hanya bisa diubah langsung oleh akun RPM; perubahan RPM tercatat sebagai baris "Koreksi Total (RPM)" di tab DAILY REPORT EMR.

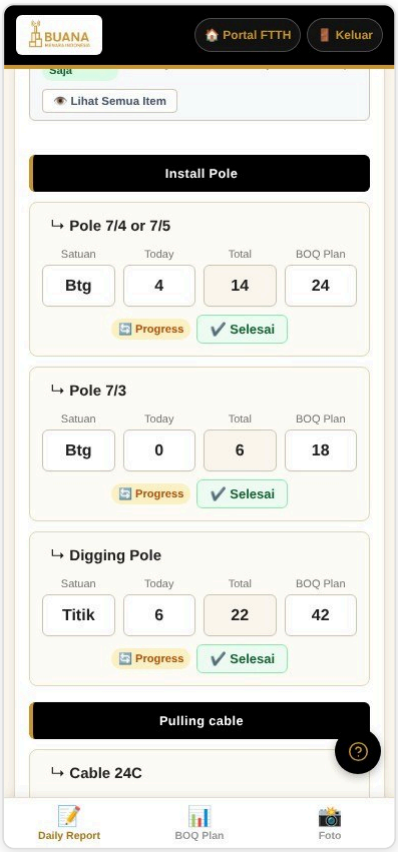


Contoh: Pole 7/4 hari ini 4 batang, Total menjadi 14 dari Plan 24.

BAGIAN C · PORTAL WASPANG · C4 · BARU


Laporan Harian – memeriksa dan mengirim (Telegram + WhatsApp)

1. Periksa kotak **Pratinjau Pesan Telegram & WhatsApp**. Isinya diperbarui otomatis setiap kali isian diubah. Tombol **Salin Teks Telegram** menyalin teks yang sama bila ingin ditempel di aplikasi lain.
2. Ketuk 🚀 **Kirim ke Telegram + WhatsApp**.
3. Jendela **Kroscek Ulang Laporan Harian Waspang** merangkum item yang Today-nya diisi. Bila sudah benar, ketuk **Ya, Sudah Yakin & Kirim**; bila belum, ketuk **Cek Ulang / Batal**.
4. Setelah masuk Telegram, muncul jendela **Kirim ke WhatsApp**: ketuk tombol hijau, pilih grup WhatsApp, lalu tekan Kirim di WhatsApp. **Nanti saja** melewati langkah ini.

Setelah terkirim, laporan masuk ke grup Telegram **@ReportBMI** dan tercatat sebagai satu baris di tab **DAILY REPORT EMR**. Kolom Today dikosongkan untuk laporan berikutnya, sedangkan Total sudah termasuk angka hari ini.

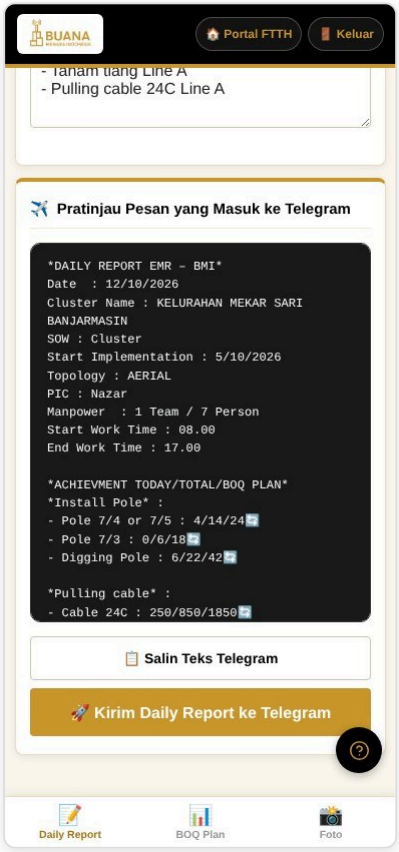

Pratinjau dan tombol kirim

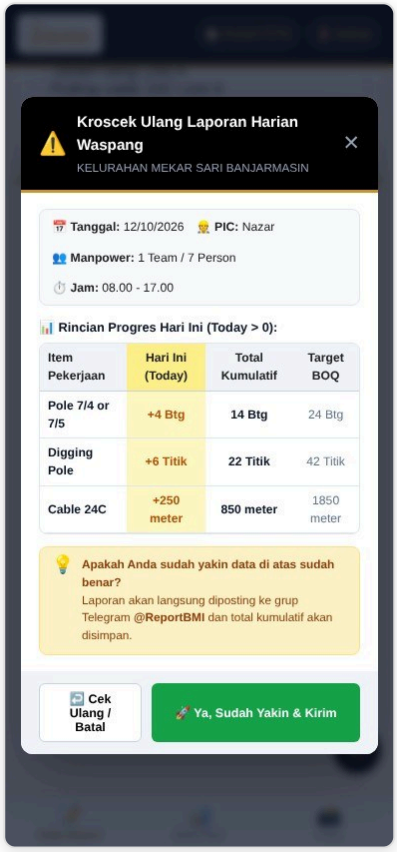

Kroscek sebelum kirim

Laporan diperiksa sekali lagi sebelum masuk ke Telegram dan spreadsheet.

BAGIAN C · PORTAL WASPANG · C5 · BARU


BOQ Plan

Menu 📊 **BOQ Plan** menyimpan target volume per site dan SOW. Angka ini yang muncul di kolom BOQ Plan pada Laporan Harian. Ada dua cara mengisinya:


- **Unggah Excel:** tarik atau pilih file BOQ (.xlsx) pada kartu **Update & Submit Tabel BOQ Plan via Excel**. Format Rekap Master BOQ Plan, BoM AE dan BoQ NRO Cluster/Feeder dikenali otomatis. Nama cluster diambil dari isi file lalu dicocokkan dengan DATA BASE; sheet yang tersembunyi di file dilewati.
- **Isi manual:** di kartu **Penyesuaian Material & Item Pekerjaan BOQ Cluster**, pilih Cluster dan SOW, ubah volume per baris, tambah baris dengan ➕ **Tambah Baris Material**, lalu ketuk 💾 **Simpan Perubahan BOQ Cluster Ini**.

BOQ Plan tersimpan di tab **MASTER BOQ CLUSTER** (satu baris per site + SOW). Angka di spreadsheet selalu menjadi acuan untuk semua HP. Kartu **Ringkasan BOQ Plan Terdaftar** menampilkan site yang sudah punya Plan. Akun RPM melihat tombol **Edit** dan **Hapus** di tiap baris; Hapus mengosongkan angka Plan cluster itu di sheet dan di semua HP, sedangkan laporan harian dan tanda Selesai tidak ikut terhapus.

> **Perhatian:** BOQ Plan adalah **target**, bukan hasil pekerjaan. Volume yang sudah dikerjakan dilaporkan lewat Laporan Harian (kolom Today), bukan diketik di BOQ Plan.

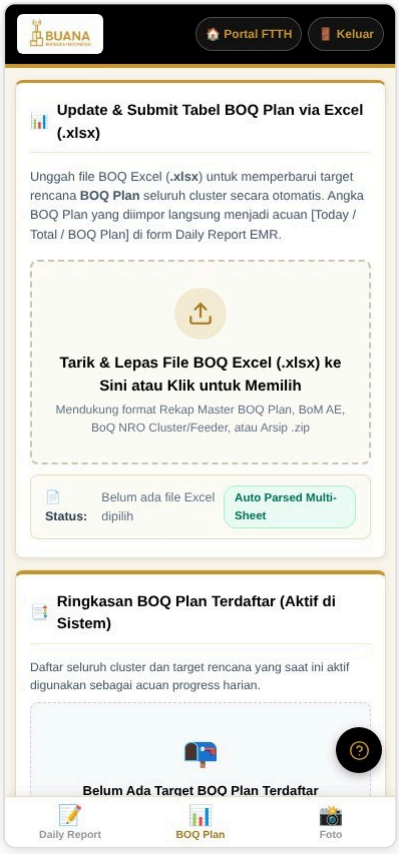

Unggah Excel

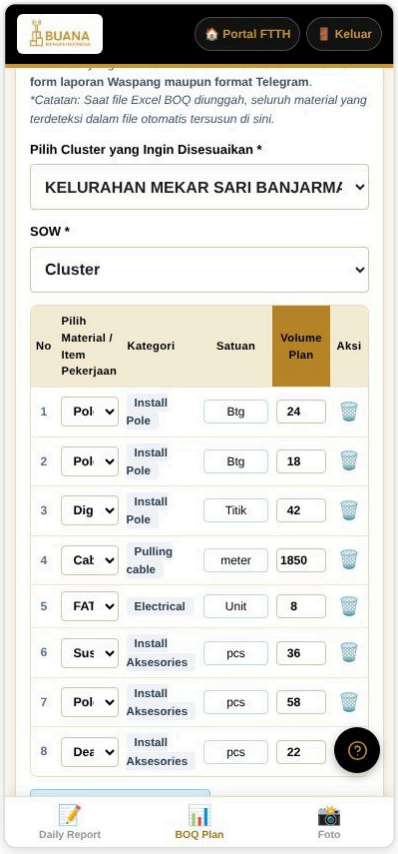

Isi atau ubah manual


Dua cara mengisi BOQ Plan.

BAGIAN C · PORTAL WASPANG · C6 · BARU


Dokumentasi Lapangan – memilih site dan kategori

Buka menu 📸 **Dokumentasi Lapangan**. Kartu paling atas berisi tautan **Buka di Google Drive** ke folder **DOKUMENTASI FTTH**, tempat semua foto tersimpan otomatis dan tersusun rapi per folder.

1. **Informasi Site & SOW:** pilih Site Name, Nama Waspang / PIC lapangan, dan SOW.
2. **Progress Pekerjaan:** pilih **Kategori Folder** (mis. Line – penarikan kabel, Elektrik/FAT, Implementasi, Pole view, Opname Lapangan), lalu ketuk salah satu tombol cepat (mis. **Cable 24C Line A**, **FAT Line B**, **Penanaman Tiang**) atau ketik keterangan progres sendiri.
3. Untuk kabel dan FAT, pilih Line (A–D), tipe kabel atau nomor FAT. Kotak **Target Progress & Folder Drive** menunjukkan folder tujuan foto.

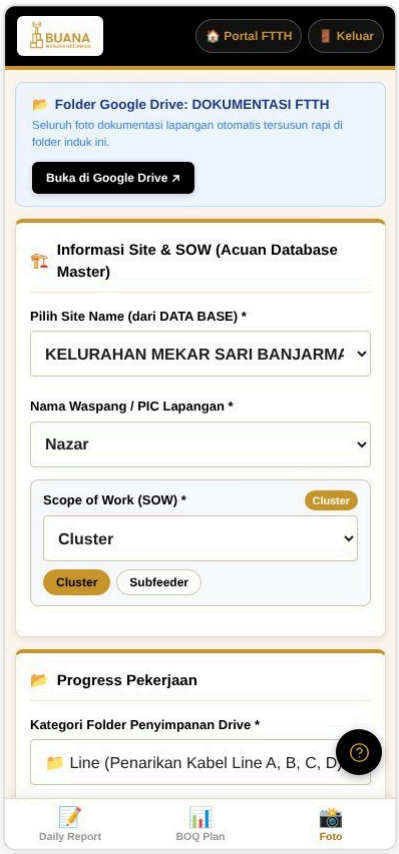

Site dan SOW

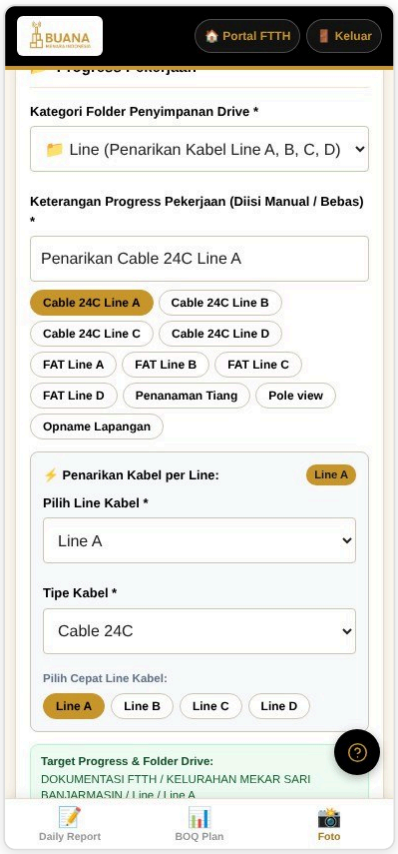

Kategori dan progres

Pilihan site, SOW dan kategori menentukan folder Drive tujuan foto.

BAGIAN C · PORTAL WASPANG · C7 · BARU

Dokumentasi Lapangan – mengirim foto dan PDF

1. Di kartu **Submit Foto Dokumentasi**, ketuk 📷 **Kamera** untuk memotret langsung atau 🖼️ **Galeri** untuk memilih beberapa foto sekaligus. File **PDF** (maksimal 15 MB per file) juga bisa dipilih dan dikirim bersama foto.
2. Periksa foto yang tampil; foto yang salah bisa dihapus dengan tanda ×.
3. Tulis **Catatan / Keterangan** bila perlu (opsional).
4. Ketuk **KIRIM FOTO KE DRIVE, TELEGRAM & WA**, lalu tunggu sampai muncul tulisan **FOTO BERHASIL DIUNGGAH & TERKIRIM**. Jangan tutup halaman selama proses berjalan. Setelah itu jendela **Kirim ke WhatsApp** muncul seperti di Laporan Harian.

Foto tersimpan di folder Drive site itu, laporan foto masuk ke grup Telegram, dan setiap foto tercatat di tab **LOG FOTO WASPANG** beserta link-nya. Tombol **Buka Folder Dokumentasi di Google Drive** pada pesan berhasil membuka folder hasil unggahan.

> **Folder site belum ada?** Tombol **Buat Struktur Folder Site di Google Drive** menyiapkan folder site, SOW, Line A–D dan subfolder FAT sekaligus. Folder juga dibuat otomatis saat foto pertama dikirim.




Pilih foto lalu kirim ke Google Drive dan Telegram.

BAGIAN C · PORTAL WASPANG · C8 · BARU

Tabel Master SOW dan tanda "Sedang Aktif"

Di bagian bawah menu Dokumentasi Lapangan ada **Tabel Master SOW Proyek**: daftar lengkap Site Name dan SOW dari sheet DATA BASE. Gunakan kotak pencarian untuk mencari site atau SOW.

- **Ketuk satu baris** untuk langsung memilih site dan SOW itu di menu Dokumentasi Lapangan, Laporan Harian dan BOQ Plan sekaligus.
- Tanda hijau **Sedang Aktif** ✅ menandai pasangan site + SOW yang sedang terpilih di form. Tanda ini hanya penanda tampilan, bukan status pekerjaan di lapangan.
- Badge di judul tabel menunjukkan jumlah data SOW dan jumlah site unik di DATA BASE saat ini.

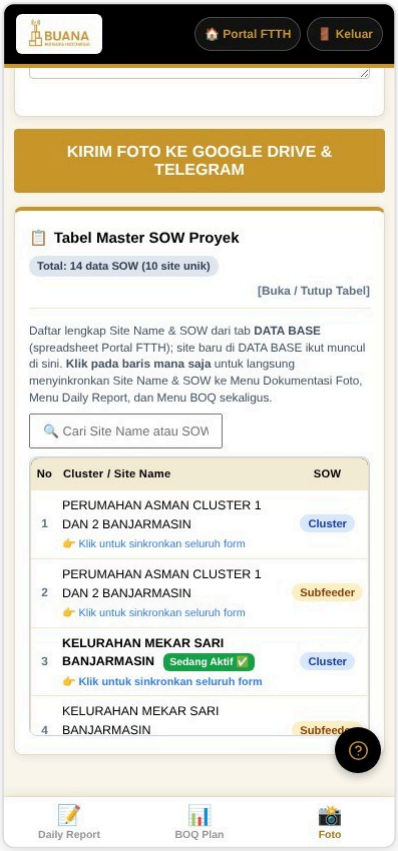

Baris yang sedang dipilih ditandai "Sedang Aktif ✅".

BAGIAN D · SPREADSHEET · D1

Sheet DASHBOARD


Sheet DASHBOARD adalah ringkasan seluruh proyek dalam satu halaman: kartu KPI (Total Site, Permit, Instalasi, BA Closing), kartu Total Donasi, kartu Dokumen Permit (target kirim dokumen H+3 setelah donasi dibayar), tabel ringkasan per region, serta beberapa grafik (Progres Implementation Status per SOW, Komposisi Status, Progres Opname, Tren Site per Bulan).

Semua kartu dan grafik membaca langsung dari sheet DATA BASE lewat rumus yang mengikuti posisi kolom berdasarkan judulnya, jadi kolom DATA BASE boleh disisipkan asalkan judulnya tidak diubah.

> **Tombol BUKA FTTH PROJECT CONTROL PORTAL** di kiri atas DASHBOARD membuka halaman masuk portal. Klik tombolnya, lalu klik tautan yang muncul di bawah tombol; ini perilaku standar Google Sheets untuk tombol berisi link.



Kartu KPI dan grafik utama.

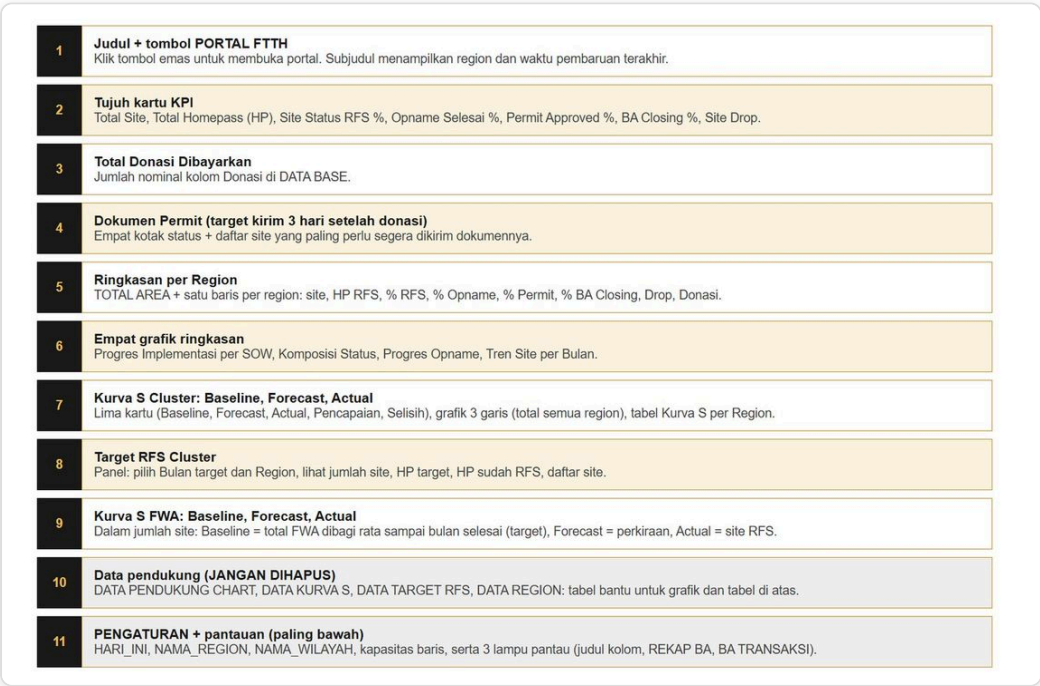

Kartu Dokumen Permit dan ringkasan per region.


BAGIAN D · SPREADSHEET · D2

Kurva S: Baseline, Forecast, Actual

Grafik Kurva S di DASHBOARD menampilkan tiga garis:

- **Baseline** – target 1.000 HP per bulan per region, garis lurus sebagai acuan.
- **Actual** – realisasi HP RFS kumulatif sesungguhnya per bulan, berhenti di bulan berjalan.
- **Forecast** – perkiraan ke depan, dihitung dari kecepatan rata-rata realisasi beberapa bulan terakhir ditambah jadwal site yang belum RFS; ditampilkan putus-putus.

Parameter (Baseline per bulan, bulan mulai, kecepatan forecast) bisa diubah di tabel "DATA KURVA S" pada bagian bawah DASHBOARD; semua kartu dan grafik menyesuaikan otomatis. Kurva S FWA dihitung terpisah dengan logika yang sama.

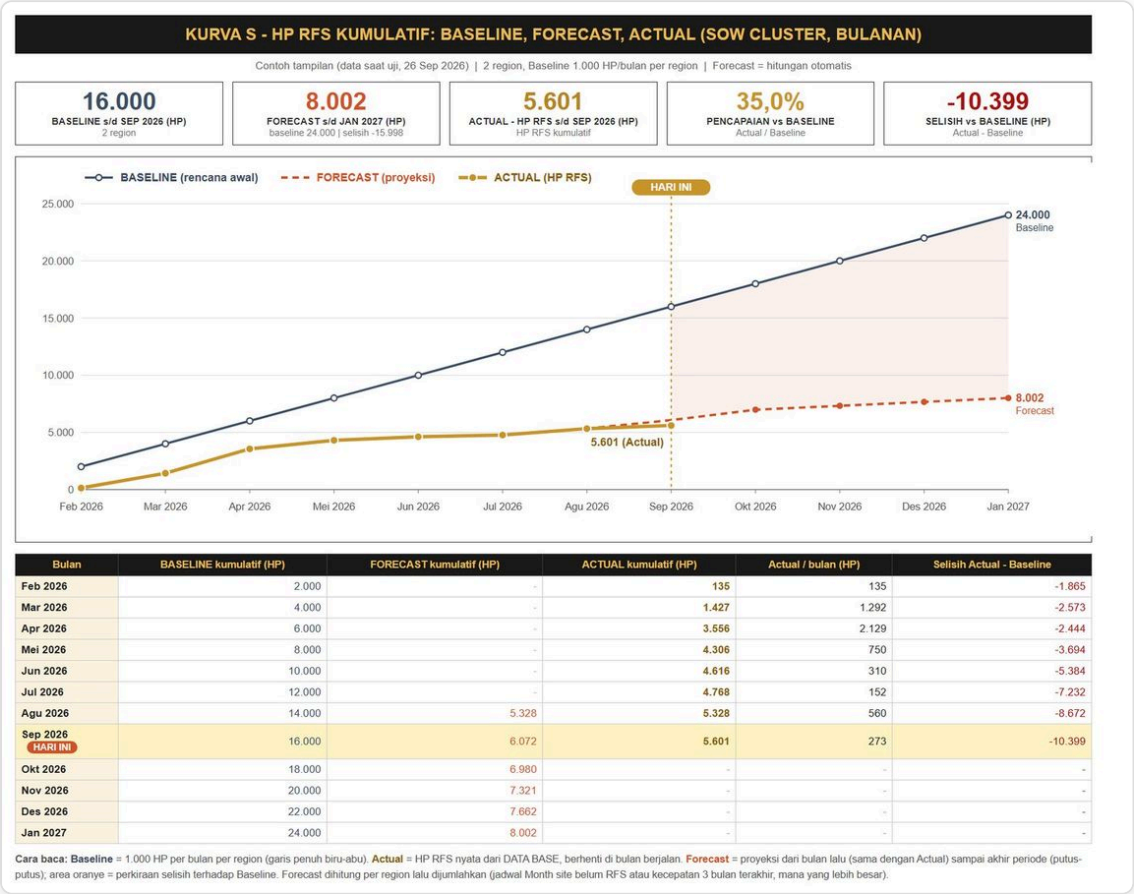

Bulan	BASELINE kumulatif (HP)	FORECAST kumulatif (HP)	ACTUAL kumulatif (HP)	Actual / bulan (HP)	Selisih Actual - Baseline
Feb 2026	2.000	-	135	135	-1.865
Mar 2026	4.000	-	1.427	1.292	-2.573
Apr 2026	6.000	-	3.556	2.129	-2.444
Mei 2026	8.000	-	4.306	750	-3.694
Jun 2026	10.000	-	4.616	310	-5.384
Jul 2026	12.000	-	4.768	152	-7.232
Agu 2026	14.000	5.328	5.328	560	-8.672
Sep 2026 HARI INI	16.000	6.072	5.601	273	-10.399
Okt 2026	18.000	6.980	-	-	-
Nov 2026	20.000	7.321	-	-	-
Des 2026	22.000	7.662	-	-	-
Jan 2027	24.000	8.002	-	-	-

Cara baca: **Baseline** = 1.000 HP per bulan per region (garis penuh biru-abu). **Actual** = HP RFS nyata dari DATA BASE, berhenti di bulan berjalan. **Forecast** = proyeksi dari bulan lalu (sama dengan Actual) sampai akhir periode (putus-putus); area oranye = perkiraan selisih terhadap Baseline. Forecast dihitung per region lalu dijumlahkan (jadwal Month site belum RFS atau kecepatan 3 bulan terakhir, mana yang lebih besar).


Kurva S Cluster: Baseline (lurus), Actual (penuh), dan Forecast (putus-putus).

BAGIAN D · SPREADSHEET · D3

Sheet DATA BASE

DATA BASE adalah sumber data utama: satu baris per site + SOW, diisi manual oleh pemilik/admin. Kolom intinya mencakup Region, Name (nama site), SOW, Donasi, Dokumen Permit, Implementation Status, HP RFS, Length (panjang kabel, terisi otomatis dari OPNAME), ATP/RECTI, PR Number, OPNAME, dan BA CLOSING.

- Site harus terdaftar dulu di DATA BASE sebelum bisa dipakai di Submit BOQ, BA Warehouse, maupun Portal Waspang.
- **Portal Waspang** mengambil daftar site langsung dari kolom **Name** dan **SOW**. Site + SOW baru akan muncul di Portal Waspang paling lambat sekitar 10 menit setelah ditambahkan.
- Kolom yang dibaca fitur lain (Kurva S, Target RFS, Dokumen, dsb.) dicari lewat judul kolom, bukan posisi hurufnya, jadi aman disisipkan asal judul tidak diubah.
- Nama site harus unik antar-region; ejaan yang sama persis (termasuk tanda baca) penting supaya BOQ, BA Warehouse dan laporan Waspang menempel ke baris yang benar.

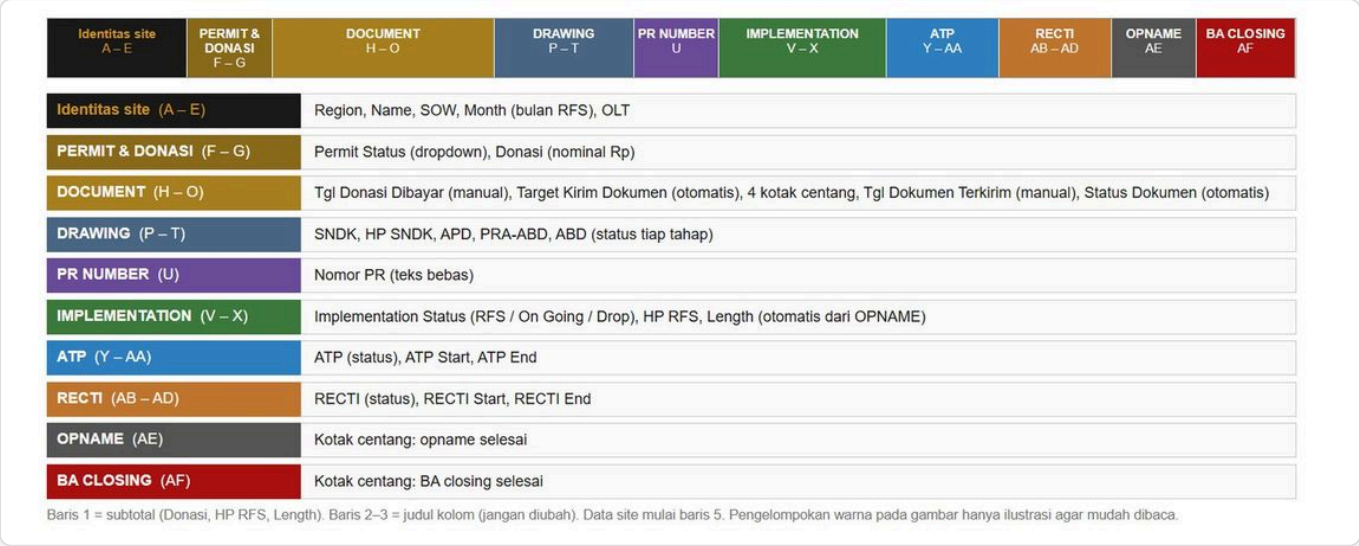

Sheet DATA BASE, sumber data utama seluruh dashboard, rekap dan Portal Waspang.


BAGIAN D · SPREADSHEET · D4

Sheet DRAWING, WAREHOUSE, OPNAME

Tiga sheet ini menerima data dari menu Submit BOQ sesuai jenis BOQ yang diunggah:

- **DRAWING** – data desain/gambar per site; kolom Designator menandai jenis material dari hasil pembacaan BOQ.
- **WAREHOUSE** – data material yang perlu disiapkan gudang; kolom Status menandai "Done" otomatis bila BA Closing site + SOW itu sudah tercentang TRUE di DATA BASE.
- **OPNAME** – data hasil opname lapangan, termasuk kolom Cable yang menjadi sumber perhitungan Length di DATA BASE.

Kolom Name di WAREHOUSE dan OPNAME berisi rumus yang merujuk ke DRAWING, jadi nama site hanya diketik sekali di DRAWING.

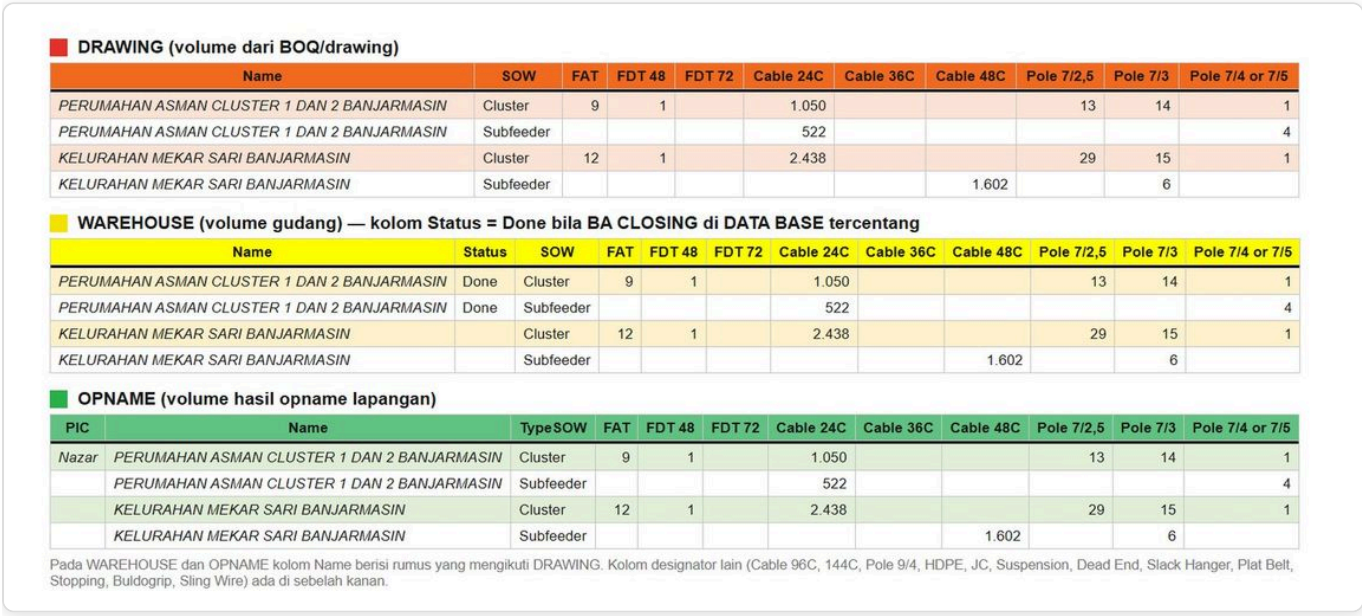

DRAWING (volume dari BOQ/drawing)

Name	SOW	FAT	FDT 48	FDT 72	Cable 24C	Cable 36C	Cable 48C	Pole 7/2,5	Pole 7/3	Pole 7/4 or 7/5
PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN	Cluster	9	1		1.050			13	14	1
PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN	Subfeeder				522					4
KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN	Cluster	12	1		2.438			29	15	1
KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN	Subfeeder						1.602		6	

WAREHOUSE (volume gudang) — kolom Status = Done bila BA CLOSING di DATA BASE tercentang

Name	Status	SOW	FAT	FDT 48	FDT 72	Cable 24C	Cable 36C	Cable 48C	Pole 7/2,5	Pole 7/3	Pole 7/4 or 7/5
PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN	Done	Cluster	9	1		1.050			13	14	1
PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN	Done	Subfeeder				522					4
KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN		Cluster	12	1		2.438			29	15	1
KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN		Subfeeder						1.602		6	

OPNAME (volume hasil opname lapangan)

PIC	Name	TypeSOW	FAT	FDT 48	FDT 72	Cable 24C	Cable 36C	Cable 48C	Pole 7/2,5	Pole 7/3	Pole 7/4 or 7/5
Nazar	*PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN*	Cluster	9	1		1.050			13	14	1
	PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN	Subfeeder				522					4
	KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN	Cluster	12	1		2.438			29	15	1
	KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN	Subfeeder						1.602		6	

Pada WAREHOUSE dan OPNAME kolom Name berisi rumus yang mengikuti DRAWING. Kolom designator lain (Cable 96C, 144C, Pole 9/4, HDPE, JC, Suspension, Dead End, Slack Hanger, Plat Belt, Stopping, Buldogrip, Sling Wire) ada di sebelah kanan.

Tiga sheet tujuan Submit BOQ, masing-masing untuk kebutuhan data yang berbeda.

BAGIAN D · SPREADSHEET · D5

Sheet BA TRANSAKSI dan REKAP BA

BA TRANSAKSI mencatat satu baris per Berita Acara (baik yang dibuat otomatis lewat "BA Transaksi" maupun yang diunggah lewat "Submit BA Transaksi"), lengkap dengan Nomor BA, site, SOW, mandor, tanggal, jenis, dan daftar material.

REKAP BA menjumlahkan otomatis per Site dan SOW (Ambil dikurangi Pengembalian), sehingga langsung terlihat sisa material yang masih di lapangan per site. Site yang sama dengan SOW berbeda (misalnya Cluster dan Subfeeder) ditampilkan di baris terpisah.

> **Lokasi REKAP BA:** disimpan di spreadsheet terpisah "BA Gudang BMI - Pengaturan dan Register" supaya spreadsheet utama lebih ringan. Menu "Buka REKAP BA" di portal mengarahkan langsung ke sana.



BA TRANSAKSI (satu baris per BA)

Name	SOW	Tanggal BA	Jam	Jenis	Mandor	Gudang	FAT	FDT 48	Cable 24C	...	Material Lain	Keterangan	
KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN	Subfeeder	26 Sep 2026	15:20	Ambil	Mandor A	Gudang Banjarmasin	3	1		...			BA
JATI BARU RT 04 BANJARMASIN	Cluster	23 Sep 2026	15:43	Ambil	Mandor B	Gudang Banjarmasin	7	1	714	...			BA

REKAP BA (material bersih per Site + SOW, otomatis)

Name	SOW	BA Ambil	BA Pengembalian	BA Terakhir	FAT	FDT 48	Cable 24C	Pole 7/2,5	Pole 7/3
TOTAL SEMUA SITE		**14**	**0**		**34**	**2**	**20.617**	**4**	**17**
JATI BARU RT 04 BANJARMASIN	Cluster	2	0	23 Sep 2026	7	1	714	4	8
JATI BARU RT 04 BANJARMASIN	Subfeeder	2	0	26 Sep 2026			123		
ABUMBUN JAYA RT 02 DAN 03 BANJARMASIN	Cluster	1	0	26 Sep 2026	23	1			

Contoh tampilan (data ilustrasi, kolom dipotong). REKAP BA = total Ambil dikurangi total Pengembalian; angka merah berarti pengembalian lebih banyak dari pengambilan.

BA TRANSAKSI (baris mentah) dan REKAP BA (ringkasan per Site/SOW).


BAGIAN D · SPREADSHEET · D6

Sheet REKON dan CLOSING OPNAME

REKON dipakai untuk rekonsiliasi material: membandingkan material yang direncanakan (dari DRAWING) dengan yang benar-benar dipakai/terpasang. **CLOSING OPNAME** merangkum hasil opname akhir per site sebagai dasar status BA Closing di DATA BASE.

Kedua sheet punya dua blok, masing-masing dengan SOW yang dipilih lewat dropdown, sehingga satu site dengan dua SOW berbeda bisa direkonsiliasi terpisah. Nama site dipilih di kotak **Name** di atas.

- Kolom **DRAWING**, **WAREHOUSE** dan **OPNAME** terisi otomatis dari sheet masing-masing untuk site + SOW yang dipilih; **BA CLOSING** diisi angka hasil BA closing.
- Warna DRAWING dan OPNAME: **hijau** bila angkanya sama, **kuning** bila berbeda (rencana tidak sama dengan realisasi).
- **STATUS** membandingkan OPNAME dengan BA CLOSING: **MATCH** bila sama, **NOT MATCH** bila berbeda atau BA CLOSING belum diisi.

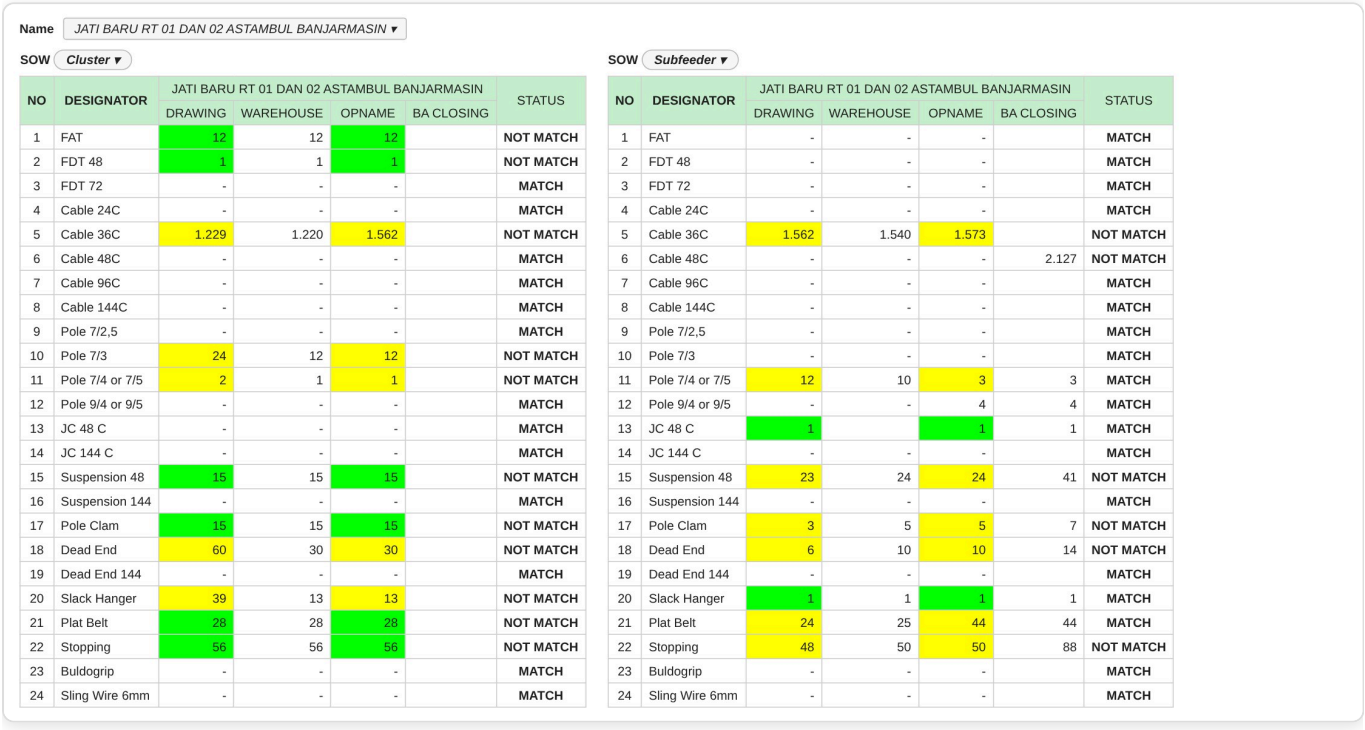

Name JATI BARU RT 01 DAN 02 ASTAMBUL BANJARMASIN ▾

SOW Cluster ▾

NO	DESIGNATOR	JATI BARU RT 01 DAN 02 ASTAMBUL BANJARMASIN				STATUS
		DRAWING	WAREHOUSE	OPNAME	BA CLOSING	
1	FAT	12	12	12		NOT MATCH
2	FDT 48	1	1	1		NOT MATCH
3	FDT 72	-	-	-		MATCH
4	Cable 24C	-	-	-		MATCH
5	Cable 36C	1.229	1.220	1.562		NOT MATCH
6	Cable 48C	-	-	-		MATCH
7	Cable 96C	-	-	-		MATCH
8	Cable 144C	-	-	-		MATCH
9	Pole 7/2,5	-	-	-		MATCH
10	Pole 7/3	24	12	12		NOT MATCH
11	Pole 7/4 or 7/5	2	1	1		NOT MATCH
12	Pole 9/4 or 9/5	-	-	-		MATCH
13	JC 48 C	-	-	-		MATCH
14	JC 144 C	-	-	-		MATCH
15	Suspension 48	15	15	15		NOT MATCH
16	Suspension 144	-	-	-		MATCH
17	Pole Clam	15	15	15		NOT MATCH
18	Dead End	60	30	30		NOT MATCH
19	Dead End 144	-	-	-		MATCH
20	Slack Hanger	39	13	13		NOT MATCH
21	Plat Belt	28	28	28		NOT MATCH
22	Stopping	56	56	56		NOT MATCH
23	Buldogrip	-	-	-		MATCH
24	Sling Wire 6mm	-	-	-		MATCH

SOW Subfeeder ▾

NO	DESIGNATOR	JATI BARU RT 01 DAN 02 ASTAMBUL BANJARMASIN				STATUS
		DRAWING	WAREHOUSE	OPNAME	BA CLOSING	
1	FAT	-	-	-		MATCH
2	FDT 48	-	-	-		MATCH
3	FDT 72	-	-	-		MATCH
4	Cable 24C	-	-	-		MATCH
5	Cable 36C	1.562	1.540	1.573		NOT MATCH
6	Cable 48C	-	-	-	2.127	NOT MATCH
7	Cable 96C	-	-	-		MATCH
8	Cable 144C	-	-	-		MATCH
9	Pole 7/2,5	-	-	-		MATCH
10	Pole 7/3	-	-	-		MATCH
11	Pole 7/4 or 7/5	12	10	3	3	MATCH
12	Pole 9/4 or 9/5	-	-	4	4	MATCH
13	JC 48 C	1		1	1	MATCH
14	JC 144 C	-	-	-		MATCH
15	Suspension 48	23	24	24	41	NOT MATCH
16	Suspension 144	-	-	-		MATCH
17	Pole Clam	3	5	5	7	NOT MATCH
18	Dead End	6	10	10	14	NOT MATCH
19	Dead End 144	-	-	-		MATCH
20	Slack Hanger	1	1	1	1	MATCH
21	Plat Belt	24	25	44	44	MATCH
22	Stopping	48	50	50	88	NOT MATCH
23	Buldogrip	-	-	-		MATCH
24	Sling Wire 6mm	-	-	-		MATCH

Sheet REKON dengan data 13 Oktober 2026 (Jati Baru RT 01 dan 02 Astambul, SOW Cluster dan Subfeeder).



1 Name JATI BARU RT 01 DAN 02 ASTAMBUL BANJARMASIN ▾ SOW Cluster ▾ 2

DESIGNATOR	Cable 24C		Cable 36C		FDT 48		FAT	
SOURCE	DRAWING	OPNAME	DRAWING	OPNAME	DRAWING	OPNAME	DRAWING	OPNAME
VOLUME	0	0	1202	0	1	0	12	0
3 STATUS	MATCH		NOT MATCH		NOT MATCH		NOT MATCH	

BOUNDARY	JALUR	CABLE	TOTAL ROUTE	TOTAL SLACK	Panjang 1 slack	TOLERANSI	ROUTE + SLACK	TOLERANSI %	OTDR LAMDA 1310	RESULT
4 CLUSTER	FDT1 LINE A	36C	1.509	14	20	-77	1.879	0,7%	1.866	MATCH


Contoh tampilan. Blok atas: bandingkan volume DRAWING dan OPNAME per designator (MATCH bila sama). Blok bawah: pemeriksaan panjang kabel (route, slack, OTDR).

Sheet CLOSING OPNAME: rangkuman akhir sebelum site dinyatakan BA Closing.


BAGIAN D · SPREADSHEET · D7

Alur kerja BA Material (flowchart)


Empat diagram berikut menjelaskan alur kerja Berita Acara material dari sudut pandang yang berbeda: gambaran besar, langkah Admin Warehouse, proses di sisi sistem, dan alur unggah PDF BA yang sudah ditandatangani.

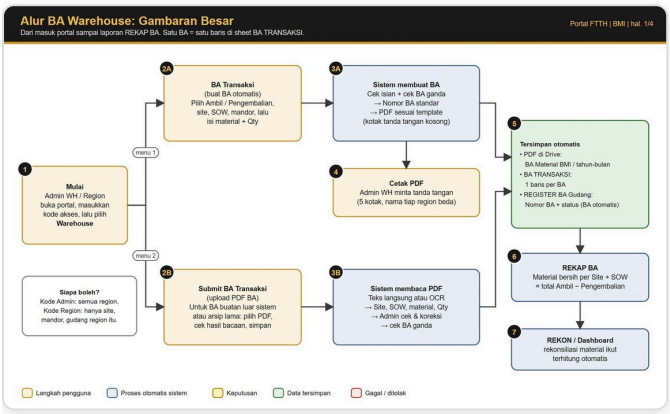


1. Gambaran besar alur BA

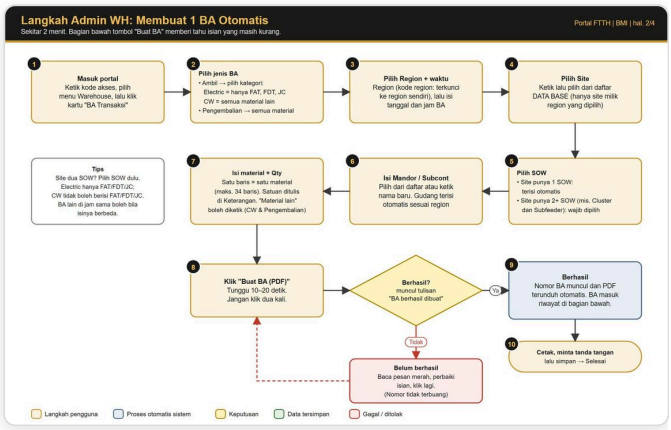

2. Langkah Admin Warehouse

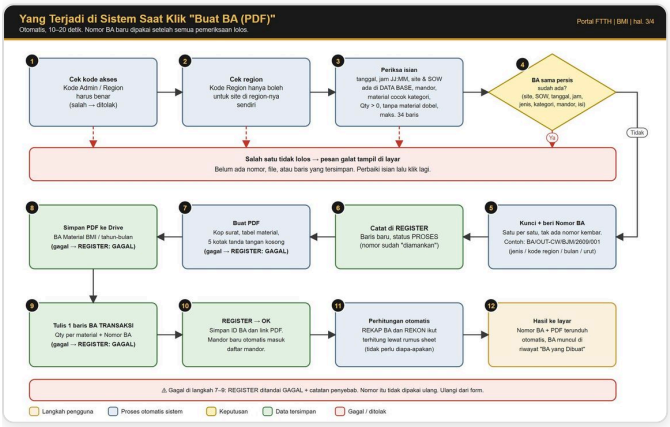

3. Proses di sisi sistem

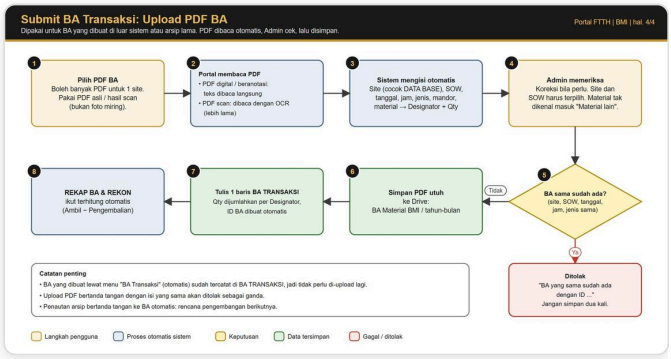

4. Alur unggah PDF BA bertanda tangan

BAGIAN D · SPREADSHEET · D8 · BARU

Spreadsheet Portal Waspang

Data Portal Waspang tersimpan di spreadsheet Waspang tersendiri, dengan tiga tab yang terisi otomatis dari portal. Judul kolom di baris pertama dipakai portal untuk mencari kolom, jadi **jangan ubah judul kolom**.

Tab	Isi
MASTER BOQ CLUSTER	Satu baris per site + SOW. Kolom material berisi BOQ Plan; kolom **Rincian Item** menyimpan rincian per Line, dan kolom **Selesai** berisi item yang ditandai selesai ("-" berarti belum ada). Diisi dari menu BOQ Plan.
DAILY REPORT EMR	Satu baris per Daily Report: tanggal, site, SOW, data laporan, Ringkasan Pencapaian, Today Activity, dan volume Today per material. **Total** di portal adalah jumlah semua baris site + SOW itu. Perubahan Total oleh RPM tercatat sebagai baris "Koreksi Total (RPM)".
LOG FOTO WASPANG	Satu baris per foto: waktu, site, SOW, nama waspang, kategori, folder, nama file, link foto dan link folder di Drive, catatan, dan status kirim Telegram.

Mengubah angka langsung di sheet: angka material di DAILY REPORT EMR dan BOQ Plan di MASTER BOQ CLUSTER boleh dibetulkan langsung di spreadsheet; portal membaca angka terbaru saat site dibuka. Jangan menghapus baris laporan tanpa koordinasi dengan RPM, karena Total dihitung dari baris-baris itu.

BAGIAN E · BILA ADA MASALAH · E1

Masuk, akun dan tampilan

"Username atau password salah" saat masuk

Periksa ejaan username dan password. Username tidak membedakan huruf besar/kecil, tetapi password harus persis sama. Bila lupa password atau akun sudah dinonaktifkan, hubungi RPM.

Diminta masuk lagi atau muncul "Sesi habis"

Sesi berlaku 6 jam. Masuk lagi di FTTH Project Control Portal, lalu buka portalnya dari menu. Di Portal Waspang, gunakan tombol 🚪 Keluar lalu masuk lagi.

Tampilan belum berubah setelah ada pembaruan

Tutup aplikasi lalu buka lagi. Di komputer, tekan **Ctrl + F5** untuk memuat ulang halaman.

Portal kosong atau muncul halaman login Google

Ini tanda pengaturan akses Web App berubah. Pemilik portal perlu mengatur ulang aksesnya ke "Siapa saja" lewat Terapkan > Kelola deployment > ikon pensil.

Jam di portal berbeda dengan jam di spreadsheet

Jam di portal mengikuti zona waktu HP/komputer yang membukanya dan diberi label WIB, WITA atau WIT. Kolom tanggal di spreadsheet memakai zona spreadsheet (WITA).

Tombol di sheet DASHBOARD tidak membuka portal

Klik tombolnya, lalu klik tautan yang muncul di bawah tombol; ini perilaku standar Google Sheets untuk tombol berisi link.

BAGIAN E · BILA ADA MASALAH · E2 · BARU

Portal FTTH

Hasil Submit BOQ tidak masuk baris yang benar

Periksa penulisan Nama Site (pilih dari daftar DATA BASE yang muncul saat mengetik, jangan mengetik bebas) dan SOW yang dipilih.

Qty dari PDF Opname salah atau kosong

Betulkan langsung di kotak Qty sebelum mengirim. Baris merah "Cek Qty" dan peringatan cek silang menunjukkan angka yang perlu dicocokkan dengan PDF. Bila salah baca terus berulang, buka "Teks hasil OCR PDF Opname", salin isinya dan kirim ke RPM atau admin.

BA gagal dibaca saat Submit BA Transaksi

Buka bagian "Teks hasil OCR" di form pratinjau untuk melihat apa yang terbaca mesin, lalu isi atau benarkan manual bila ada yang salah atau terlewat.

Unduhan FORM ATP atau BA membuka tab/jendela baru

Unduhan seharusnya langsung tersimpan tanpa membuka tab baru. Bila masih terjadi, muat ulang portal setelah pembaruan terbaru aktif.

BAGIAN E · BILA ADA MASALAH · E3 · BARU

Portal Waspang

Site tidak ada di daftar

Site + SOW harus terdaftar di sheet DATA BASE Portal FTTH (kolom Name dan SOW). Setelah ditambahkan, tunggu sekitar 10 menit lalu buka ulang Portal Waspang.

Kolom BOQ Plan bernilai 0 atau item tidak muncul di Laporan Harian

Site + SOW itu belum punya BOQ Plan. Isi dulu di menu BOQ Plan (C5), atau ketuk **Lihat Semua Item** untuk menampilkan semua material.

Total tidak sesuai

Total adalah jumlah semua Laporan Harian site + SOW itu di tab DAILY REPORT EMR. Pastikan tidak ada laporan ganda atau salah ketik di kolom Today. Koreksi Total hanya bisa dilakukan akun RPM, atau langsung di spreadsheet (lihat D8).

Laporan atau foto gagal terkirim

Periksa sinyal internet, lalu kirim ulang. Pesan gagal di layar menyebutkan penyebabnya. Untuk foto, jangan menutup halaman sampai muncul tulisan "FOTO BERHASIL DIUNGGAH & TERKIRIM".

Kritik & Saran gagal dikirim: "Sesi habis"

Kritik & Saran memerlukan akun yang sedang masuk. Keluar lalu masuk lagi lewat FTTH Project Control Portal, kemudian kirim ulang masukan.

Salah memilih SOW

Pilih ulang SOW di kotak SOW sebelum mengirim. Laporan yang sudah terkirim dengan SOW salah perlu dibetulkan di tab DAILY REPORT EMR oleh RPM.

> **Butuh bantuan lain?** Kirim pertanyaan atau usulan lewat tombol **?** > **Kritik & Saran** di portal mana pun; RPM akan membacanya di tab KRITIK DAN SARAN.
